

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 44022
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: voscare@gmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4539487
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/06/2015



Klant / Opdrachtgever:
VOSCARE
VOLDERSSTRAAT 41
9500 GERAARDSBERGEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Steenbakkerij 73 GERAARDSBERGEN 9500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 17/06/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2040 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY
Eigendom van: Build To Invest
Installateur: VOSCARE VOLDERSSTRAAT 41 9500 GERAARDSBERGEN
B.T.W.: BE0453870621 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut.maatsch. Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 3,34 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 2,16 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ zie schema in bijlage ☐ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☒ gasmeter ☒ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen.
N Toestellen en verlichtingsarmaturen, incl. transfo's, zijn nog niet allemaal geplaatst.


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


De Agent-onderzoeker


LOT 73

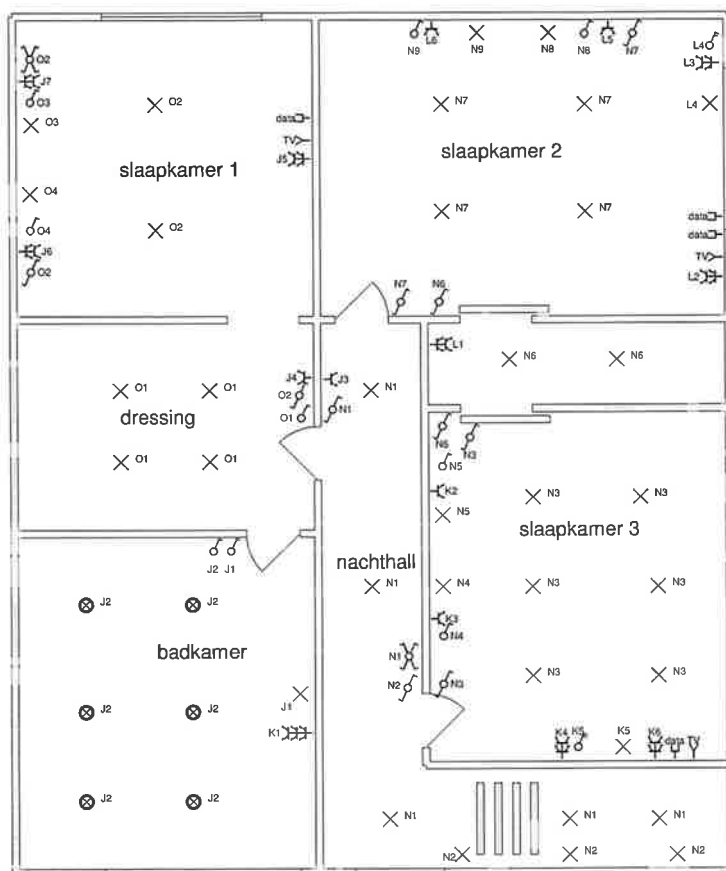

Ronny Tielemans • Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/290.018
ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be

RP4539487 - 17/06/2015

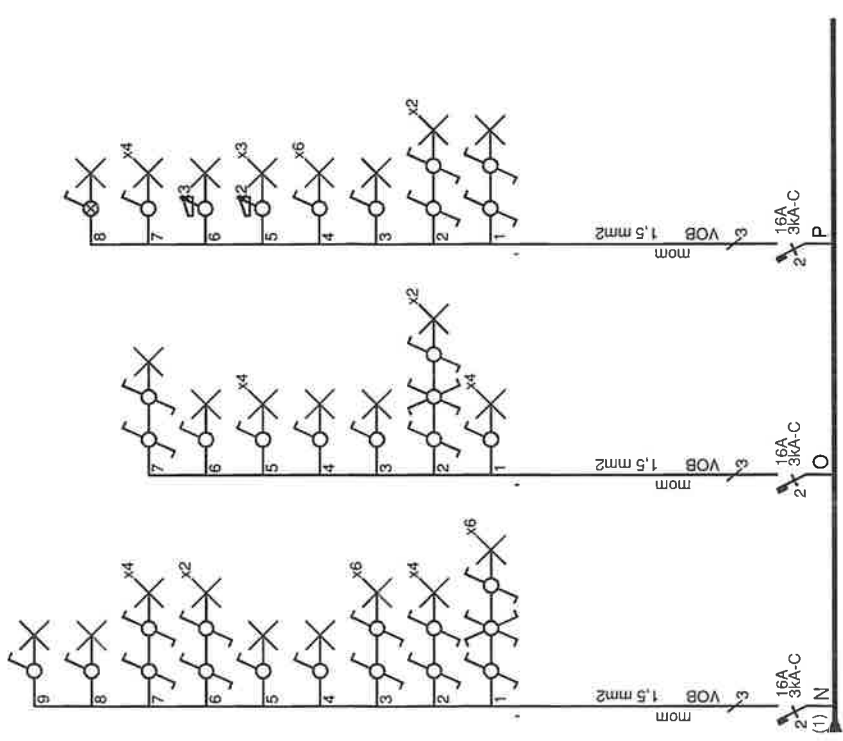	Afgév. erkend organisme Ronny Tielemans • Inspecteur OCB Regio Oost- en West-Vlaanderen GSM: 0496/290.013 ronny.tielemans@ocb.be - www.ocb.be BuildTo Invest Steenbakkerij 73 9500 Geraardsbergen   VosCare bvba Voldersstraat 41 9500 Geraardsbergen 0475/44.59.66 ondernemingsnr 0453870621 rijksregisternr 66.06.23-381.66		BORD A	
--	--	--	---	--

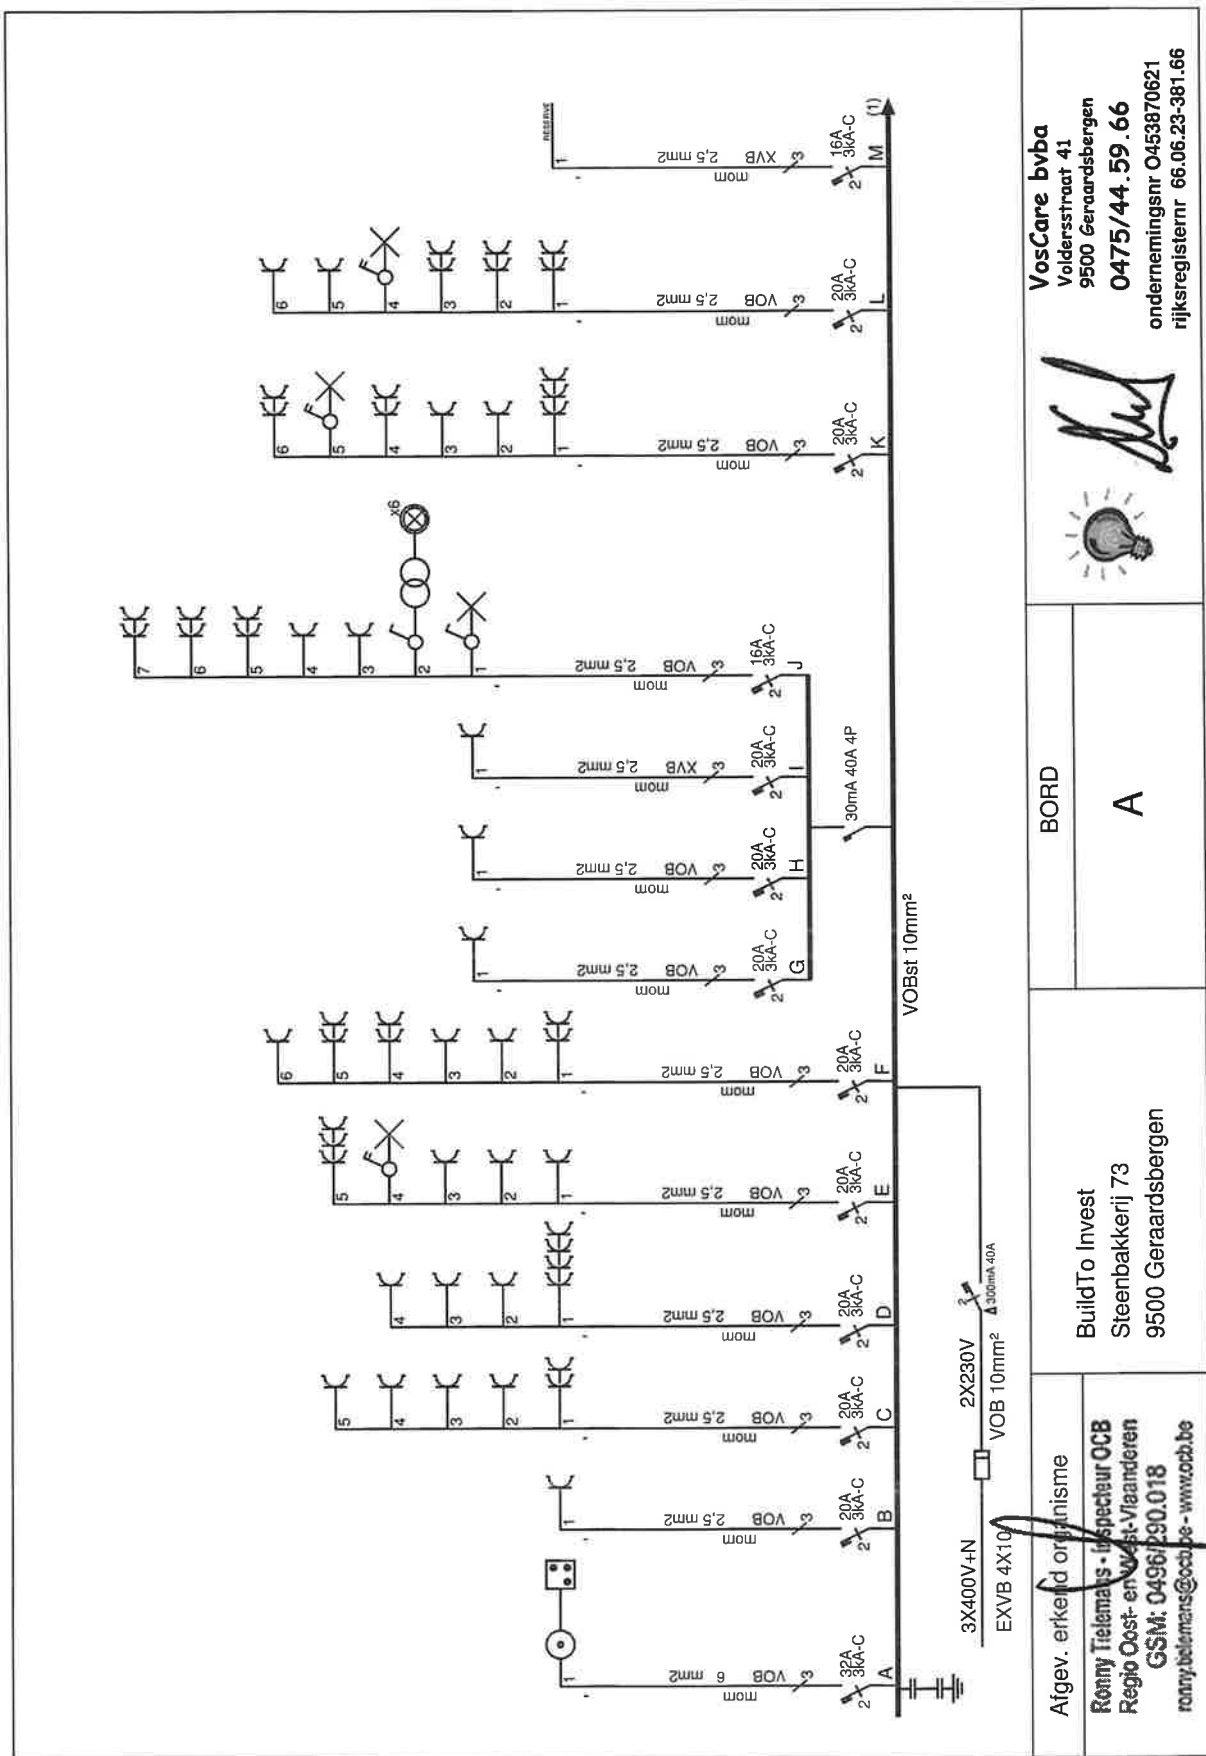

VosCare bvba

Voldersstraat 41

9500 Geraardsbergen

0475/44.59.66

ondernemingsnr 0453870621

rijksregisternr 66.06.23-381.66



BORD

A

BuildTo Invest
Steenbakkerij 73
9500 Geraardsbergen

Afgev. erkend organisme

Ronny Tielmans - Inspecteur OCB

Regio Oost- en West-Vlaanderen

GSM: 0496/290.018

ronny.tielmans@ocb.be - www.ocb.be

RP4539487 - 17/06/2015
